※本書は重要事項説明書作成システムの動作検証用に作成した架空のサンプルです。実在の不動産・法人・個人とは一切関係ありません。

飲用水・電気・ガス・排水施設の整備状況　調査回答書

対象地	札幌市中央区伏見二丁目3番12（ザ・ステージ伏見 503号室）
調査日	令和8年10月2日

1. 上水道（札幌市水道局　中央区担当）

前面道路配水管	東側 市道 伏見7号線　**口径 φ150mm（ダクタイル鋳鉄管・平成10年布設）**
引込管	**口径 φ50mm（1本・東側道路より引込／平成17年布設）**
給水方式	**直結増圧給水方式（受水槽・高置水槽なし）** **増圧給水ポンプユニット：1階ポンプ室設置（平成17年設置・令和5年ポンプ更新）**
簡易専用水道の届出	**不要（貯水槽を設けていないため）**
メーター	各戸検針（札幌市水道局による個別検針・個別徴収）　503号室 メーター番号 S-50301
凍結対策	**・引込管の埋設深は1.5m以上（札幌市の凍結深度0.9mに対し余裕を確保）** **・各住戸のメーターボックス及びパイプスペースには凍結防止帯（ヒーター）を設置** **・長期不在時（概ね3日以上）は水抜き栓による水抜きが必要です（各住戸の玄関脇に水抜き栓あり）** **・共用部の散水栓は11月～4月の間、元栓を閉止し水抜きを行っています**
専有部分の給水管	**503号室は2026年8月のリノベーション工事により、 専有部分の給水管（架橋ポリエチレン管）を全面更新済**
他人地通過	無

2. 下水道（札幌市下水道河川局　中央下水管理センター）

処理区域	**公共下水道 処理区域内（創成川水再生プラザ）**
排除方式	**分流式（汚水と雨水を別系統で排除）**
汚水本管	東側 市道　口径 φ200mm（塩化ビニル管・平成9年布設）　埋設深 約2.8m
雨水本管	東側 市道　口径 φ400mm（鉄筋コンクリート管・平成9年布設）
取付管	汚水 φ150mm（1箇所）／雨水 φ200mm（2箇所）
公設ます	敷地東側に汚水ます1箇所、雨水ます2箇所
受益者負担金	清算済
浄化槽	無
融雪水の排水	**敷地内ロードヒーティングによる融雪水は雨水系統に排除しています。　なお、札幌市の条例により、屋根の雪を公道に投棄することは禁止されています。**

3. 都市ガス（北海道ガス株式会社　札幌支店）

供給区域	**供給区域内（都市ガス 13A）**
本支管	東側 市道　低圧本支管　**口径 φ100mm（ポリエチレン管・平成12年布設）**
引込管	口径 φ50mm（1本・東側道路より引込）

供給方式	**各戸個別供給（ガスメーターは各住戸のパイプスペース内に設置・個別契約／個別徴収）**
503号室	ガスメーター番号 HG-50301／マイコンメーター設置済
暖房・給湯方式	**ガス温水式セントラルヒーティング（各戸個別方式）** **・熱源：ガス温水ボイラー（各住戸のバルコニーに設置／503号室は2026年9月に交換）** **・放熱：温水パネルヒーター（503号室は全室に計5台設置／2026年9月交換）** **・給湯：同一ボイラーによる給湯（24号相当）** **※暖房費は各戸のガス使用量に応じた個別負担です（管理費には含まれません）。** **※冬期（11月～4月）のガス代の目安は月額 15,000円～28,000円程度です。**
灯油設備	**無（灯油タンク・配管とも設置されていません）**
プロパンガス	無


4. 電気（北海道電力ネットワーク株式会社）

受電方式	**各戸個別契約（一括受電方式は導入していません）** **小売電気事業者は各区分所有者が自由に選択できます。**
503号室 契約容量	従量電灯B　50A（リノベーション時に40A→50Aへ変更）
共用部の受電	低圧受電（共用部電灯・動力）
非常用発電機	**有（2020年10月設置／ディーゼル発電機 30kVA／連続運転 72時間）** **2018年9月の北海道胆振東部地震に伴う大規模停電（ブラックアウト）を受けて、　2019年5月の通常総会決議により設置。停電時は共用部照明、エレベーター1基、　給水増圧ポンプ、機械室の最低限の電源を確保します（専有部分への給電はありません）。**
ロードヒーティング	**有（電気式・発熱線埋設）** **・設置範囲：敷地内通路（エントランスまで）、駐車場出入口スロープ、ごみ置場前　計約310㎡** **・設置年：平成17年（2005年）／令和元年（2019年）に発熱線を全面更新** **・運転：11月中旬～4月上旬（降雪センサー＋温度センサーによる自動運転）** **・冬期の電気料金は年間約1,900,000円（管理費会計から支出）** **※駐車場の車室部分にはロードヒーティングは設置されていません。**

5. 情報通信・テレビ

インターネット	**各戸個別契約（全戸一括加入方式ではありません）** **MDF室まで NTT東日本の光ファイバーが引込済で、各住戸へは既存の配管を利用して個別に引込可能。** **利用料は各区分所有者の個別負担となります（管理費には含まれません）。**
テレビ	地上デジタル（共聴・UHF）／BS・110度CS（共聴）／ケーブルテレビ引込 有（個別契約）
電話	NTT東日本　光回線引込済

6. 埋設状況図（抜粋）

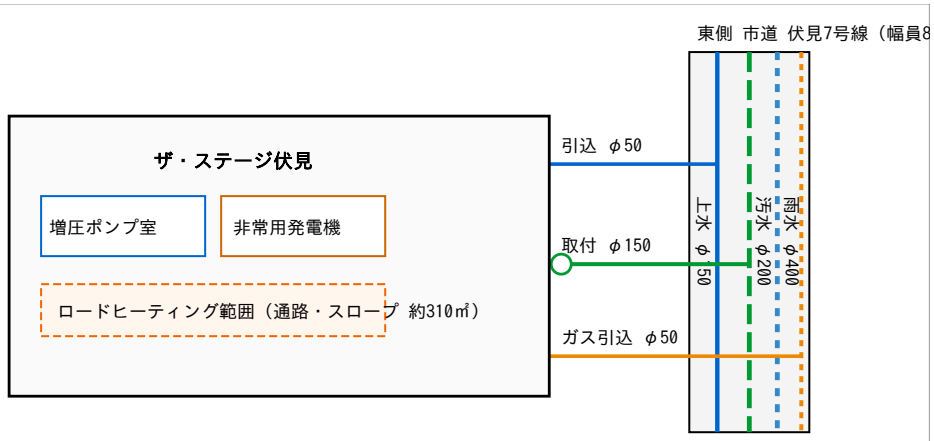

出典：札幌市水道局・下水道河川局・北海道ガス 各埋設状況図を基に作成（架空のサンプル）
